

Eindverslag

Gent, Sanderwal 20
Projectcode opgraving: 2022F35
Dagrapporten

1 Maandag 22 augustus 2022

1.1 Personeel

Robrecht Vanoverbeke (BAAC – rapporteur)

Ann-Sophie De Witte (BAAC)

Kraanman Stefaan VDV

1.2 Bezoek

/

1.3 Weer

Zonnig en droog – ca. 25°

1.4 Werkzaamheden en interpretaties

- Start uitgraven zwembad: 6,80 m op 13,60 m (aan elke zijde van zwembad 0,5 m extra).
- Uitgraving is tot ca. 1,35 m onder maaiveld – zwembad komt tot 45 cm boven maaiveld; dus minder diep dat in PvM.
- Inplanting is ook gewijzigd t.o.v. PvM
- Uitgraving helemaal binnen ophoging 19^{de} eeuws; puinig en geen grondsporen
- Er zit 1 fundering in de lengte van de WP: S1002, recent (20^e E)
- Profiel A gedocumenteerd tegen N-putwand
- Boring erbij gezet: 0,5 m onder vlak zit op MB

1.5 Strategische en praktische keuzes

/

1.6 Conclusies overleg

/

2 Dinsdag 23 augustus 2022

2.1 Personeel

Robrecht Vanoverbeke (BAAC – rapporteur)

Ann-Sophie De Witte (BAAC)

Kraanman Stefaan VDV

2.2 Bezoek

/

2.3 Weer

Zonnig en droog – ca. 25°

2.4 Werkzaamheden en interpretaties

- Laatste meters van de werkput werden gegraven: geen veranderend beeld. Fundering S1002 loopt door.
- 2de bodemprofiel B: puinige lagen; MB op 55cm onder vlak – maaiveld op 7m90 – vlak op 6m65 – MB op 6m10 TAW.
- Veldwerk voorlopig afgerond
- Nog inspectie bij het steken van de waterput.

2.5 Strategische en praktische keuzes

/

2.6 Conclusies overleg

/

3 Dinsdag 8 november 2022

3.1 Personeel

Robrecht Vanoverbeke (BAAC – rapporteur)

Kraanman Stefaan VDV

3.2 Bezoek


/

3.3 Weer

Droog, bewolkt – ca. 15°

3.4 Werkzaamheden en interpretaties

- Zwembad geplaatst
- Regenput: 5 m x 1,80 m x 1,45 m
- Muur recent S2001 in verlengde huis: 1 steens 20cm breed, ro bst 18x8x4,5; veel verschillende stenen recup; harde zandkalkmortel; top ca 35 onder maaiveld, ok op ca 90 onder maaiveld. Gefundeerd op puin.
- S2002: ronde waterput, 1,5 steens breed 31 cm; ro bst récent 18x8,5x4,5; harde cementmortel; aan binnenzijde laagje cementmortel.
- Uitgraving tot max. 1,5 onder nulpas
- Ronde waterput op 1,55 m onder nulpas of 1m70 onder maaiveld
- Gegraven tot 2m20 onder maaiveld = geen MB!!

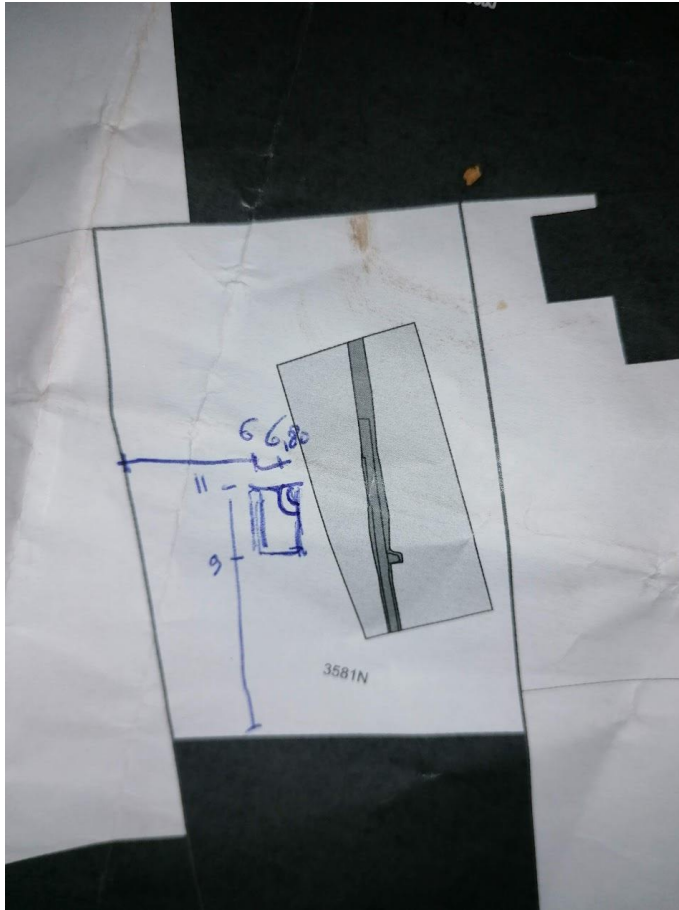

3.5 Strategische en praktische keuzes

/

3.6 Conclusies overleg

/
