



Archeologienota
Realisatie masterplan Park Groot Schijn - district Deurne
Aanleg tijdelijke parking

Programma van Maatregelen voor behoud in situ




1. Afbakening van de zone die in situ behouden blijft

Algemeen geldt dat de te behouden zone qua oppervlakte samenvalt met het gehele onderzoeksgebied. Binnen deze oppervlakte moeten alle bodemlagen dieper dan 40 cm onder het huidige maaiveld onverstoord behouden blijven.

Er zijn momenteel geen doorsneden beschikbaar van de geplande werken. De ontgravingsdieptes per ingreep zijn echter wel bekend (zie plan). Op het plan zijn ook de bestaande leidingen in het onderzoeksgebied weergegeven.

Als toegangsweg voor de tijdelijke parking wordt aan de noordzijde van de skischans een bijkomende strook asfalt gelegd op een zone die momenteel al verhard is als fietspad (figuur 3 licht grijs gearceerd). De hiervoor benodigde bodemingrepen reiken tot maximaal 38 cm onder het maaiveld. Binnen de parkingzone worden de rijstroken en de parkeerplaatsen voor andersvaliden aangelegd in betonstraatstenen. Voor de aanleg hiervan reiken de bodemingrepen tot maximaal 39 cm onder het maaiveld. De overige parkeerplaatsen worden in grasbetondallen aangelegd, waarvoor de bodemingrepen eveneens tot maximaal 39 cm onder het maaiveld reiken. Tenslotte zullen voor de afwerking van onder andere parkeervakken boordstenen en stutten geplaatst worden waarvoor de bodem tot maximaal 40 cm onder het maaiveld verstoord wordt.

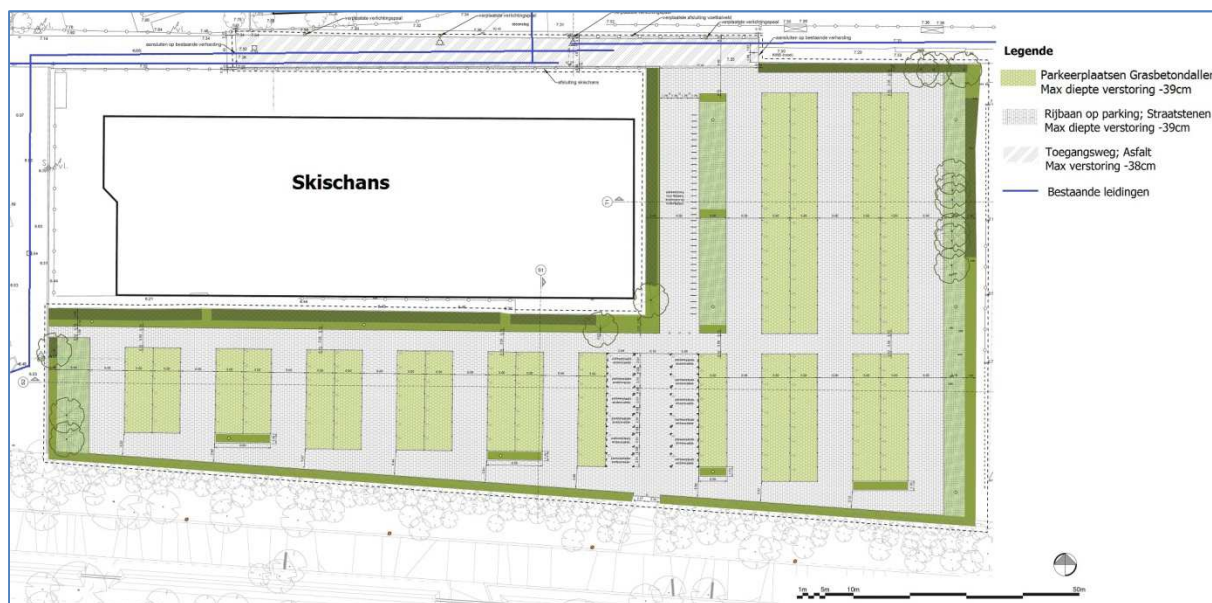

Ontwerpplan met aanduiding van de verschillende ingrepen (bron: Ontwerp en Uitvoering stad Antwerpen).



2 Strategie voor het behoud in situ

Indien de geplande ontgravingsdieptes en de hier beschreven uitvoeringswijze gerespecteerd worden, zijn geen plaanpassingen noodzakelijk. Indien in de loop van het project blijkt dat toch (kleine) plaanpassingen nodig zijn om andere redenen dan archeologie, mag in geen geval een diepere ontgravingsdiepte gehanteerd worden.

3 Vereisten aan de uitvoeringswijze van de geplande werken

Er wordt geen grond gestockeerd op het graafvlak, ook niet voor korte duur.

Er wordt gegraven met een kraan met gladde bak. Tijdens de graafwerken wordt nooit dieper gegraven dan de geplande ontgravingsdiepte (ook niet tijdelijk). Omdat niet over het onbeschermd graafvlak mag gereden worden door zware machines, moeten de kraanwerken op zulke wijze uitgevoerd worden dat de kraan nooit over het graafvlak hoeft te rijden.

Nadat het vlak is afgegraven dient zo snel mogelijk de geplande bodembedekking aangebracht te worden. Indien het hiervoor noodzakelijk is om over de afgegraven zone te rijden met machines, dienen eerst rijplaten aangebracht te worden; er mag in geen geval over het onbeschermd graafvlak gereden worden.

4 Competenties waarover de uitvoerder dient te beschikken

Het personeel van de aannemer dient in het kader van het archeologisch behoud in situ niet over bijzondere competenties te beschikken. Uiteraard dienen zij wel in staat te zijn om te voldoen aan de vereisten zoals beschreven in § 3.

5 Risicofactoren bij de uitvoering

Er wordt geen archeologisch veldonderzoek uitgevoerd.

Algemeen geldt dat de graafwerken worden uitgevoerd conform de vigerende veiligheidsvoorschriften.

6 Voorstel voor het deponeren van het archeologisch ensemble

De geplande werken voor het aanleggen van een tijdelijke parking zullen naar verwachting geen archeologisch ensemble opleveren. Momenteel bestaat er voor het onderzoeksgebied geen archeologisch ensemble.

Voorstel van bewaarplaats voor een eventueel archeologisch ensemble is:

Stad Antwerpen depot dienst archeologie

Havanastraat 5 (blok E)

2030 Luchtbal-Antwerpen

Om eventueel archeologisch vondstmateriaal kwaliteitsvol te behandelen en te bewaren wordt beroep gedaan op een **conservator**. De conservator coördineert het geheel van conservatiehandelingen die binnen het onderzoek gesteld worden. Indien nodig komt de conservator ter plaatse voor advies of gespecialiseerde handelingen. De conservator heeft ervaring met de behandeling van aardewerk en metaalvondsten uit verschillende periodes (metaaltijden-romeinse tijd-vroege middeleeuwen-middeleeuwen).

Indien bij het onderzoek van het vondstenensemble specialistische kennis vereist is, wordt een **materiaaldeskundige** betrokken.
