

Dagrapport werkzaamheden Conventionele en Toxische Explosieven

Datum: 25/03/2024

Operator: Jensy Herpoel

1) Projectinfo

Project nr C-ZAR	2024-010
Opdrachtgever	Monument Vandekerckhove
Referentie Opdrachtgever	01A16330
Project leider	Dhr. Bart Bartholomieux
Locatie	Langemark
Adres	Poelkapellestraat 18
Contact persoon ter plaatse	Dhr. Kylian Verhaevert
Soort werkzaamheden	Werfbegeleiding CTE
	Opsporing en Benadering
	Oppervlakedetectie (Multi-sonde)
	Dieptedetectie
	Duikwerk CTE

2) Beschrijving werkzaamheden

CTE-begeleiding bij proefsleuven.

3) Tijdslijn

0800hr: Aankomst werf + overleg TL.

0810hr: veiligheidsbriefing (Pierre Legrand, Kylian Verhaevert, Jeroen Vereyser)

1000hr: Verwittigen lokale politie (Arro Ieper)

1230hr: pauze

1300hr: Aankomst politie

1500hr: Interventie DOVO

1600hr: Einde werken

4) Uren

Begin werken	0800hr
Einde werken	1600hr
Pauzes	nvt
Totaal gewerkte uren	8

5) Detectoren

Vallon VX1	Nº: Nvt
Vallon VMH 4	Nº: Nvt

6) Gevonden CTE

Aantal	Type	Toestand	Herkomst
1	Artillerie, 6 Inch	Afgevuurd, ontsteker in plaats	GBR
1	Artillerie, 15Lbs	Afgevuurd, ontsteker in plaats	GBR
8	Artillerie, 18Lbs	8 afgevuurd, 1 ontsteker in plaats	GBR
1	Artillerie, 7,7cm	Gewapend	DEU
5	KKM, .303	Gewapend	GBR
2	Ontsteker, n°100	Afgevuurd	GBR
2	Ontsteker, n°80	Afgevuurd	GBR
2	Ontsteker, GrZ15	Afgevuurd	DEU
1	Ontsteker, DoppZ 17	Afgevuurd	DEU
2	Restant ontsteker	Vere staat van corrosie	?
1	Mortier, 3inch Stokes	Afgevuurd, geen ontsteker (Lont)	GBR

* Alle CTE worden door onze operatoren geïdentificeerd binnen het redelijke en het mogelijke in de staat waarin ze gevonden worden, teneinde een gedegen risicobeoordeling ten velde, uitgaande van een "worst-case-scenario" te kunnen maken. Na jaren in de bodem is het door schade, corrosie en of aangekoekte klei of residuen vaak onmogelijk zonder gedegen opschoonwerk een correcte identificatie te voorzien. Een 100% identificatie is op Belgisch grondgebied een taak die wettelijk vooralsnog enkel maar door DOVO mag uitgevoerd worden.

7) Opmerkingen

- Veel scherven en schroot gevonden in opgehoogde kleilaag.
- Diepte van gevonden CTE tussen 50cm-mv tot 1m-mv
- Controleslag gebeurd op archeologisch niveau. Vrijgave in de sleuven tot 30cm onder werkvlak.

Advies: Gezien de densiteit van gevonden CTE; bij vervolgwerkzaamheden is het absoluut noodzakelijk dat er beheersmaatregelen genomen worden inzake CTE.

8) Foto's

Fotografisch overzicht van de meest merkwaardige vondsten CTE en de totale vondsten balans.



Figuur 1: CTE vondsten in afwachting DOVO.



Figuur 2: 7.7cm Artilleriegranaat (DEU), in afwachting interventie DOVO.




Figuur 3: 7.7cm Artilleriegranaat (DEU), close up van de ontsteker EKZ.



Figuur 4: 7.7cm Artilleriegranaat, lange versie vermoedelijk TOX lading (DEU)



Figuur 5: 7.7cm artilleriegranaat, lange versie, vermoedelijk TOX lading (DEU), in de sleuf

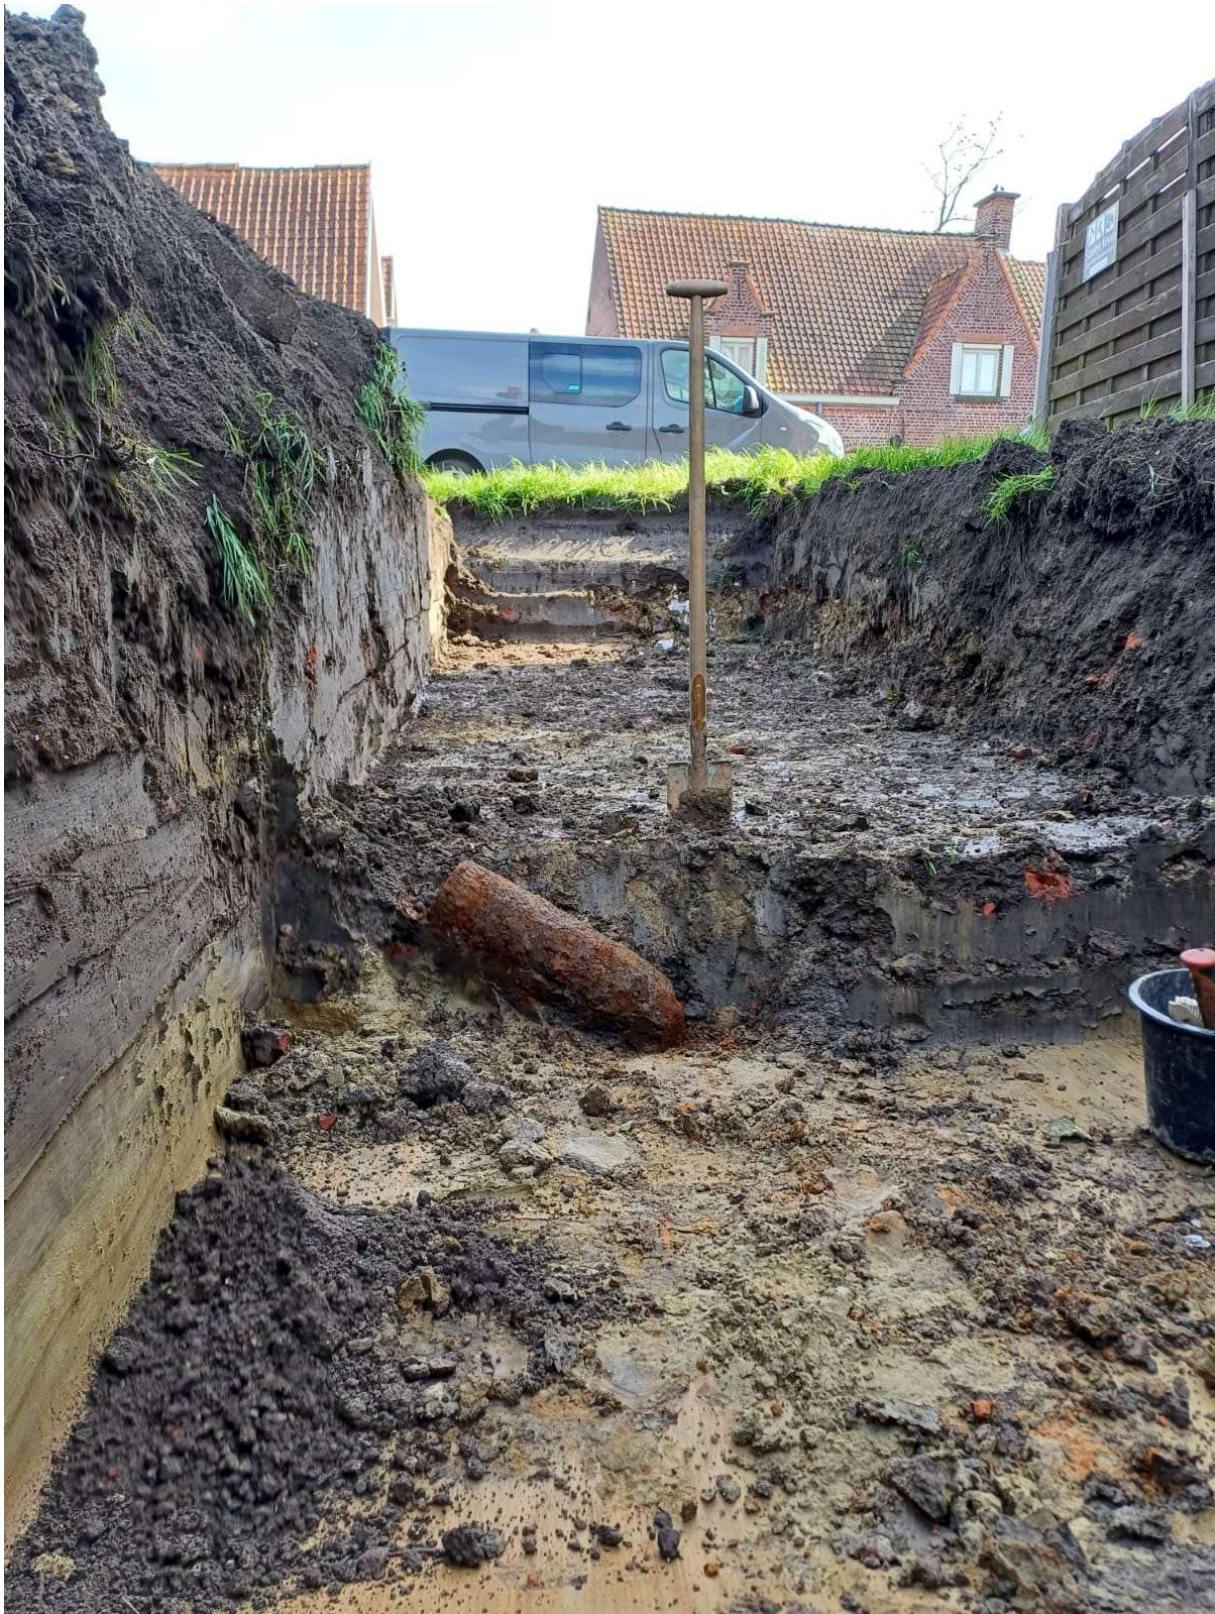

Figuur 6: 6Inch howitzer (GBR) in situ



Figuur 7: 6Inch Artilleriegranaat (GBR) in situ



Figuur 8: kop van 3inch Stokes mortier (GBR), met lont wat een indicatie kan zijn voor een vroege inzet in de Eerste Wereldoorlog.



Figuur 9: 3inch Stokes mortar (GBR)



Figuur 10: 18Lbs Artilleriegranaat (GBR), zonder ontsteker in situ



Figuur 11: CTE vondsten aan het einde van Sleuf 1. (4x 18Lbs Artilleriegranaat en verschillende ontstekers)



Figuur 12: Dopp Z 17, ontsteker met dubbele werking (Duits) close-up.



Figuur 13: 18Lbs Artilleriegranaat (GBR), zonder ontsteker in situ

